		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Greepam**	**219,875 days?**	**02.11.17 09:00**	**05.09.18 17:00**	
2		**Project start**	**42,875 days?**	**02.11.17 09:00**	**01.01.18 17:00**	
3		Prepare outcome description	6,875 days?	02.11.17 09:00	10.11.17 17:00	
4		Prepare demo screens	6,875 days?	02.11.17 09:00	10.11.17 17:00	
5		Approval from EPAM Management	36 days?	13.11.17 08:00	01.01.18 17:00	3;4
6		**Initiation**	**4,875 days?**	**02.01.18 09:00**	**08.01.18 17:00**	**2**
7		Ensure developers and testers	2,875 days?	02.01.18 09:00	04.01.18 17:00	
8		Ensure hardware, software, testing tools	2 days?	05.01.18 08:00	08.01.18 17:00	7
9		Ensure PR availability	4,875 days?	02.01.18 09:00	08.01.18 17:00	
10		Ensure office space	1 day?	05.01.18 08:00	05.01.18 17:00	7
11		**Initial design**	**5 days?**	**09.01.18 09:00**	**16.01.18 09:00**	**6**
12		Gather information about public transport	1 day?	09.01.18 09:00	10.01.18 09:00	
13		Gather information about parking places	1 day?	09.01.18 09:00	10.01.18 09:00	
14		Research software physics	1 day?	10.01.18 09:00	11.01.18 09:00	12;13
15		Research external API for software solu...	1 day?	11.01.18 09:00	12.01.18 09:00	14
16		Prepare with HR benefits policy	1 day?	09.01.18 09:00	10.01.18 09:00	
17		Design software architecture	1 day?	12.01.18 09:00	15.01.18 09:00	12;13;14;15
18		Design UX and GUI mobile and web look	1 day?	12.01.18 09:00	15.01.18 09:00	12;13;14;15;16
19		Plan software milestones and tests	1 day?	15.01.18 09:00	16.01.18 09:00	16;17;18
20		**Software implementation**	**2 days?**	**09.02.18 09:00**	**13.02.18 09:00**	**11**
21		Iterative backend implementation	1 day?	09.02.18 09:00	12.02.18 09:00	
22		Iterative GUI implementation	1 day?	09.02.18 09:00	12.02.18 09:00	
23		Initial user tests of all use cases	1 day?	12.02.18 09:00	13.02.18 09:00	21;22
24		**Full and stable**	**3 days?**	**01.06.18 08:00**	**05.06.18 17:00**	**20**
25		Ensure software stability on various plat...	1 day?	01.06.18 08:00	01.06.18 17:00	
26		Fixing bugs found in tests	1 day?	01.06.18 08:00	01.06.18 17:00	
27		End user prototype tests	1 day?	04.06.18 08:00	04.06.18 17:00	26
28		Deploy stable software version	1 day?	05.06.18 08:00	05.06.18 17:00	26;27
29		**Releasing and campaign**	**3 days?**	**01.08.18 08:00**	**03.08.18 17:00**	**24**
30		Organize promotion campaing in Epam ...	1 day?	01.08.18 08:00	01.08.18 17:00	
31		Organize opening party in EPAM	1 day?	02.08.18 08:00	02.08.18 17:00	30
32		Organize public campaign in media (soc...	1 day?	03.08.18 08:00	03.08.18 17:00	31
33		Software support	1 day?	02.08.18 08:00	02.08.18 17:00	30
34		**Research and observations**	**3 days?**	**03.09.18 08:00**	**05.09.18 17:00**	**29**

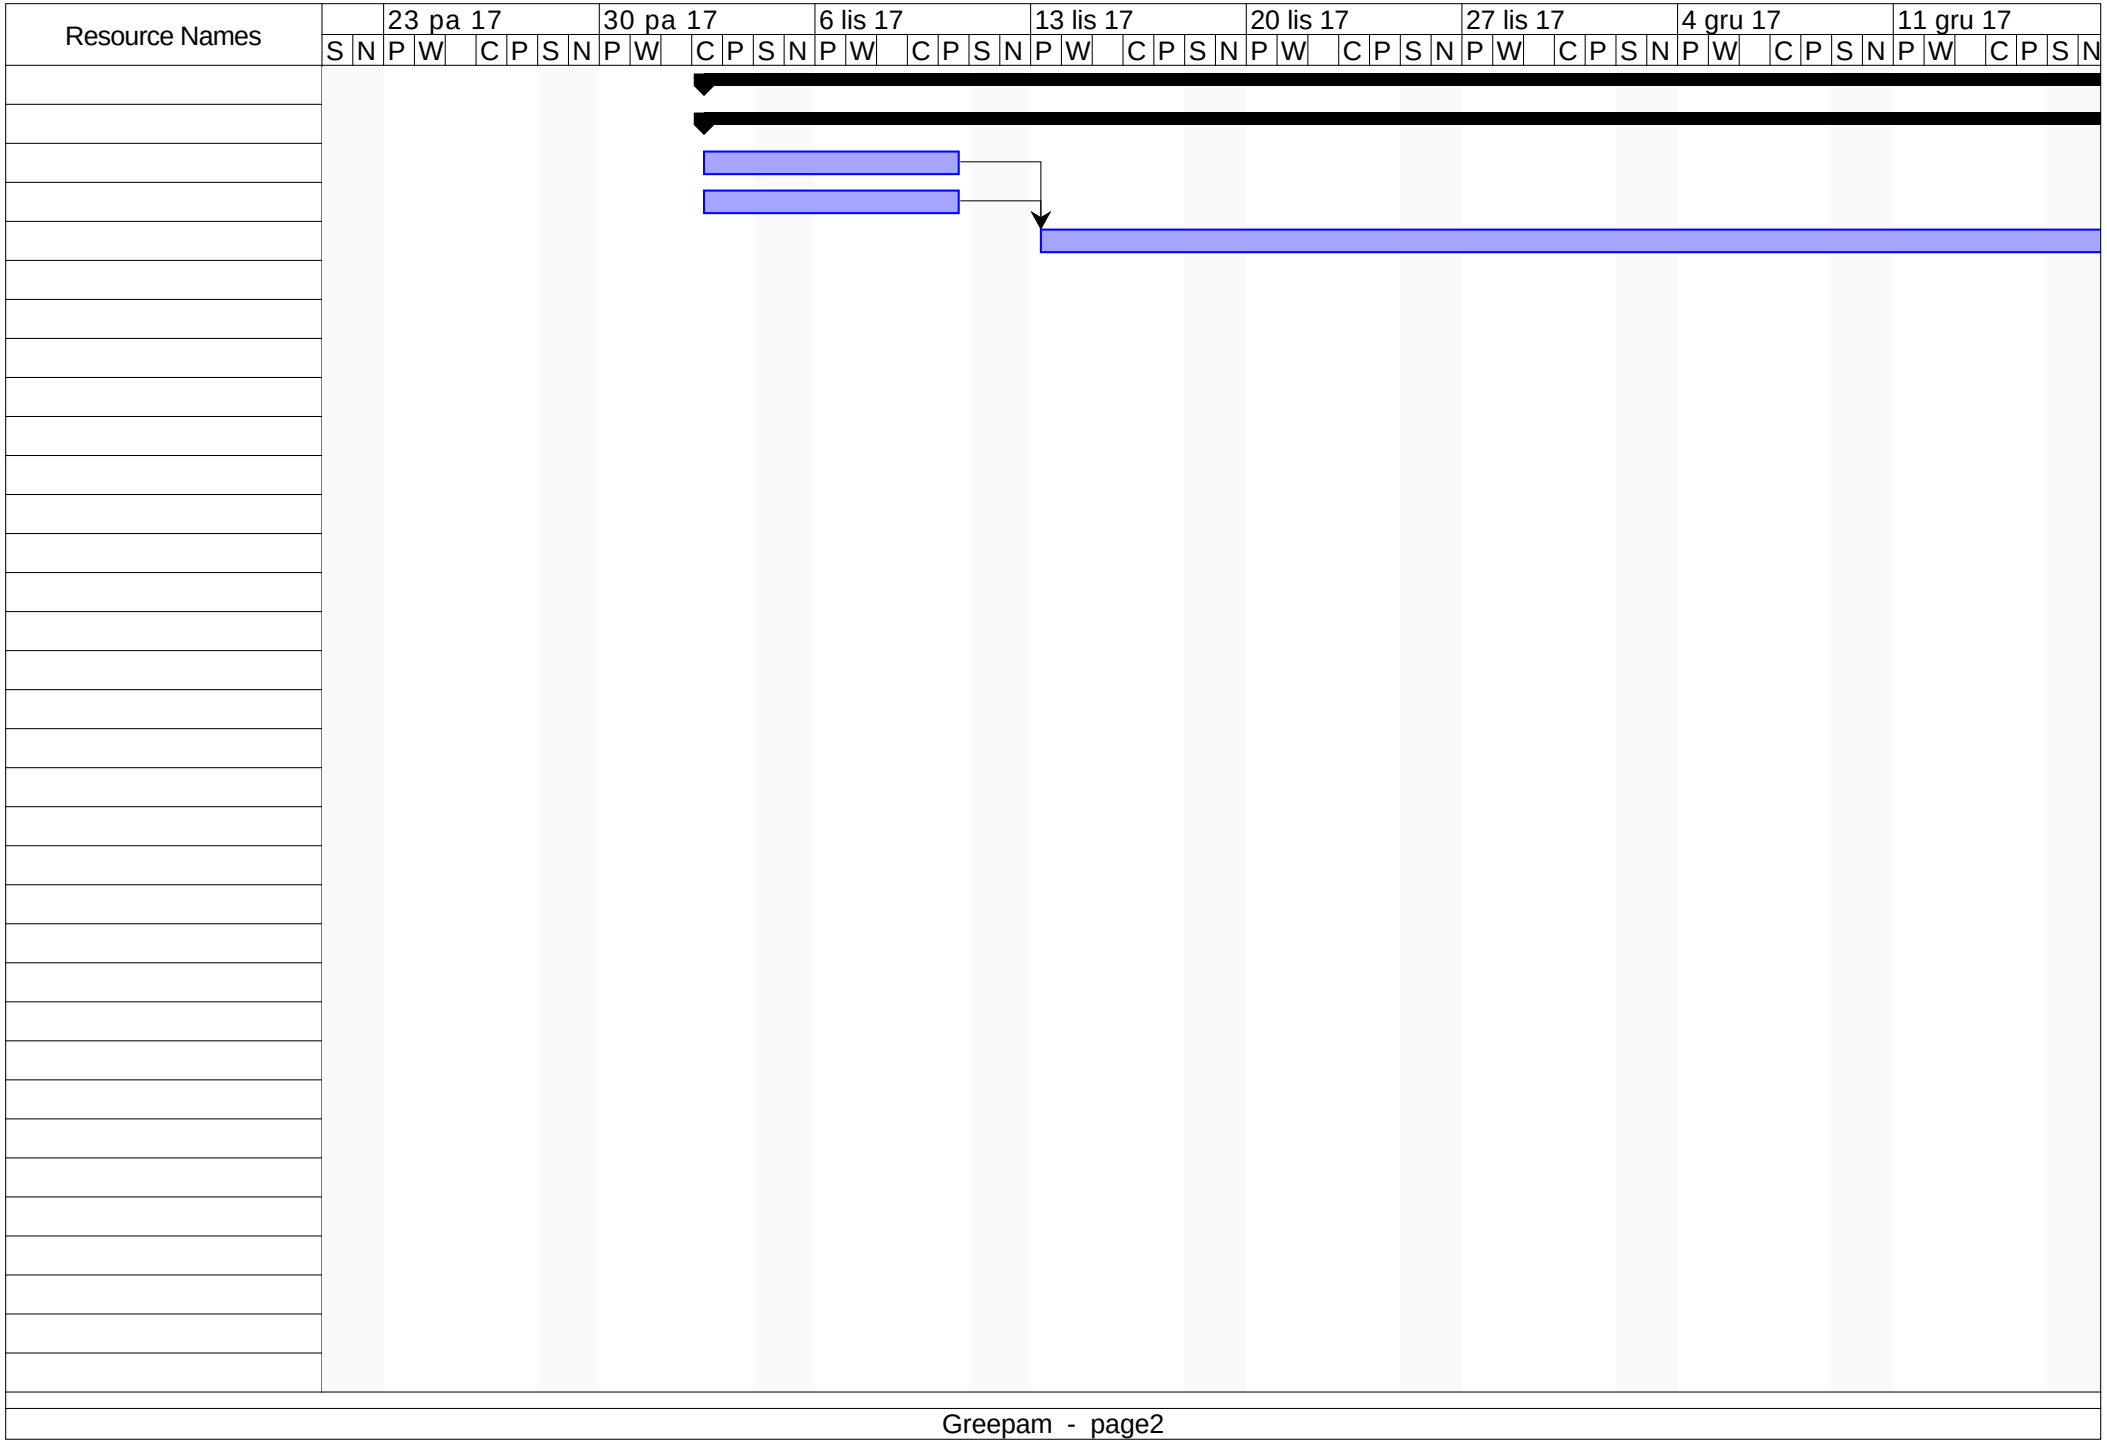
Resource Names
23 pa 17
30 pa 17
6 lis 17
13 lis 17
20 lis 17
27 lis 17
4 gru 17
11 gru 17
S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N

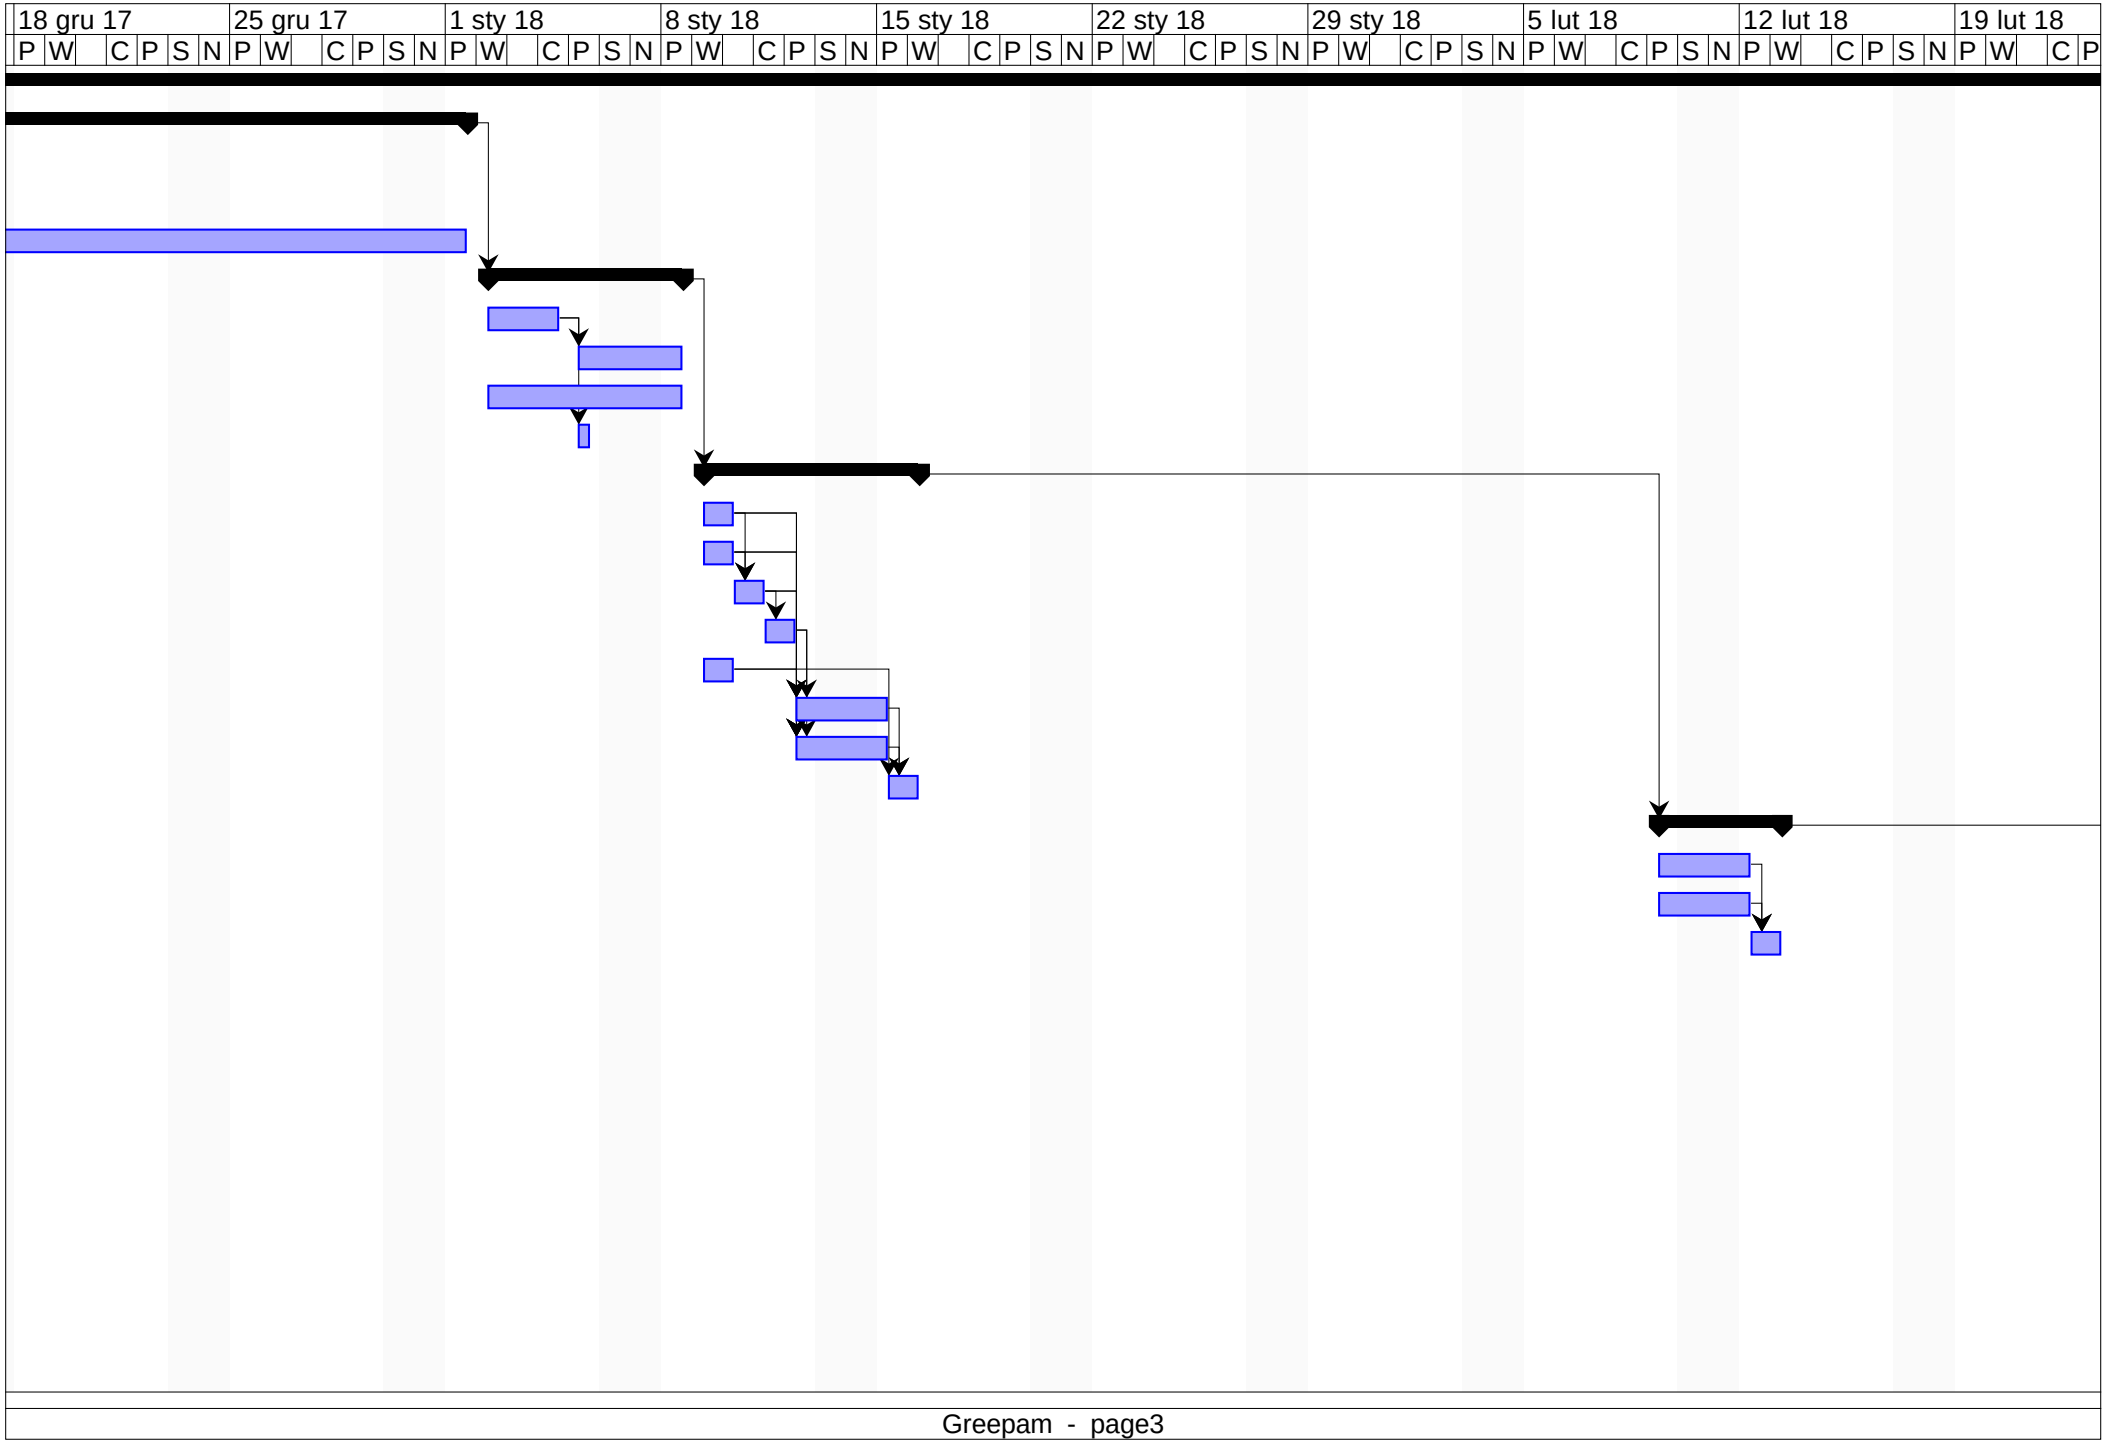
18 gru 17
25 gru 17
1 sty 18
8 sty 18
15 sty 18
22 sty 18
29 sty 18
5 lut 18
12 lut 18
19 lut 18
P W C P S N

| | 26 lut 18 | | | | | | | 5 mar 18 | | | | | | | 12 mar 18 | | | | | | | 19 mar 18 | | | | | | | 26 mar 18 | | | | | | | 2 kwi 18 | | | | | | | 9 kwi 18 | | | | | | | 16 kwi 18 | | | | | | | 23 kwi 18 | | | | | | | 30 kwi |
|---|---|---

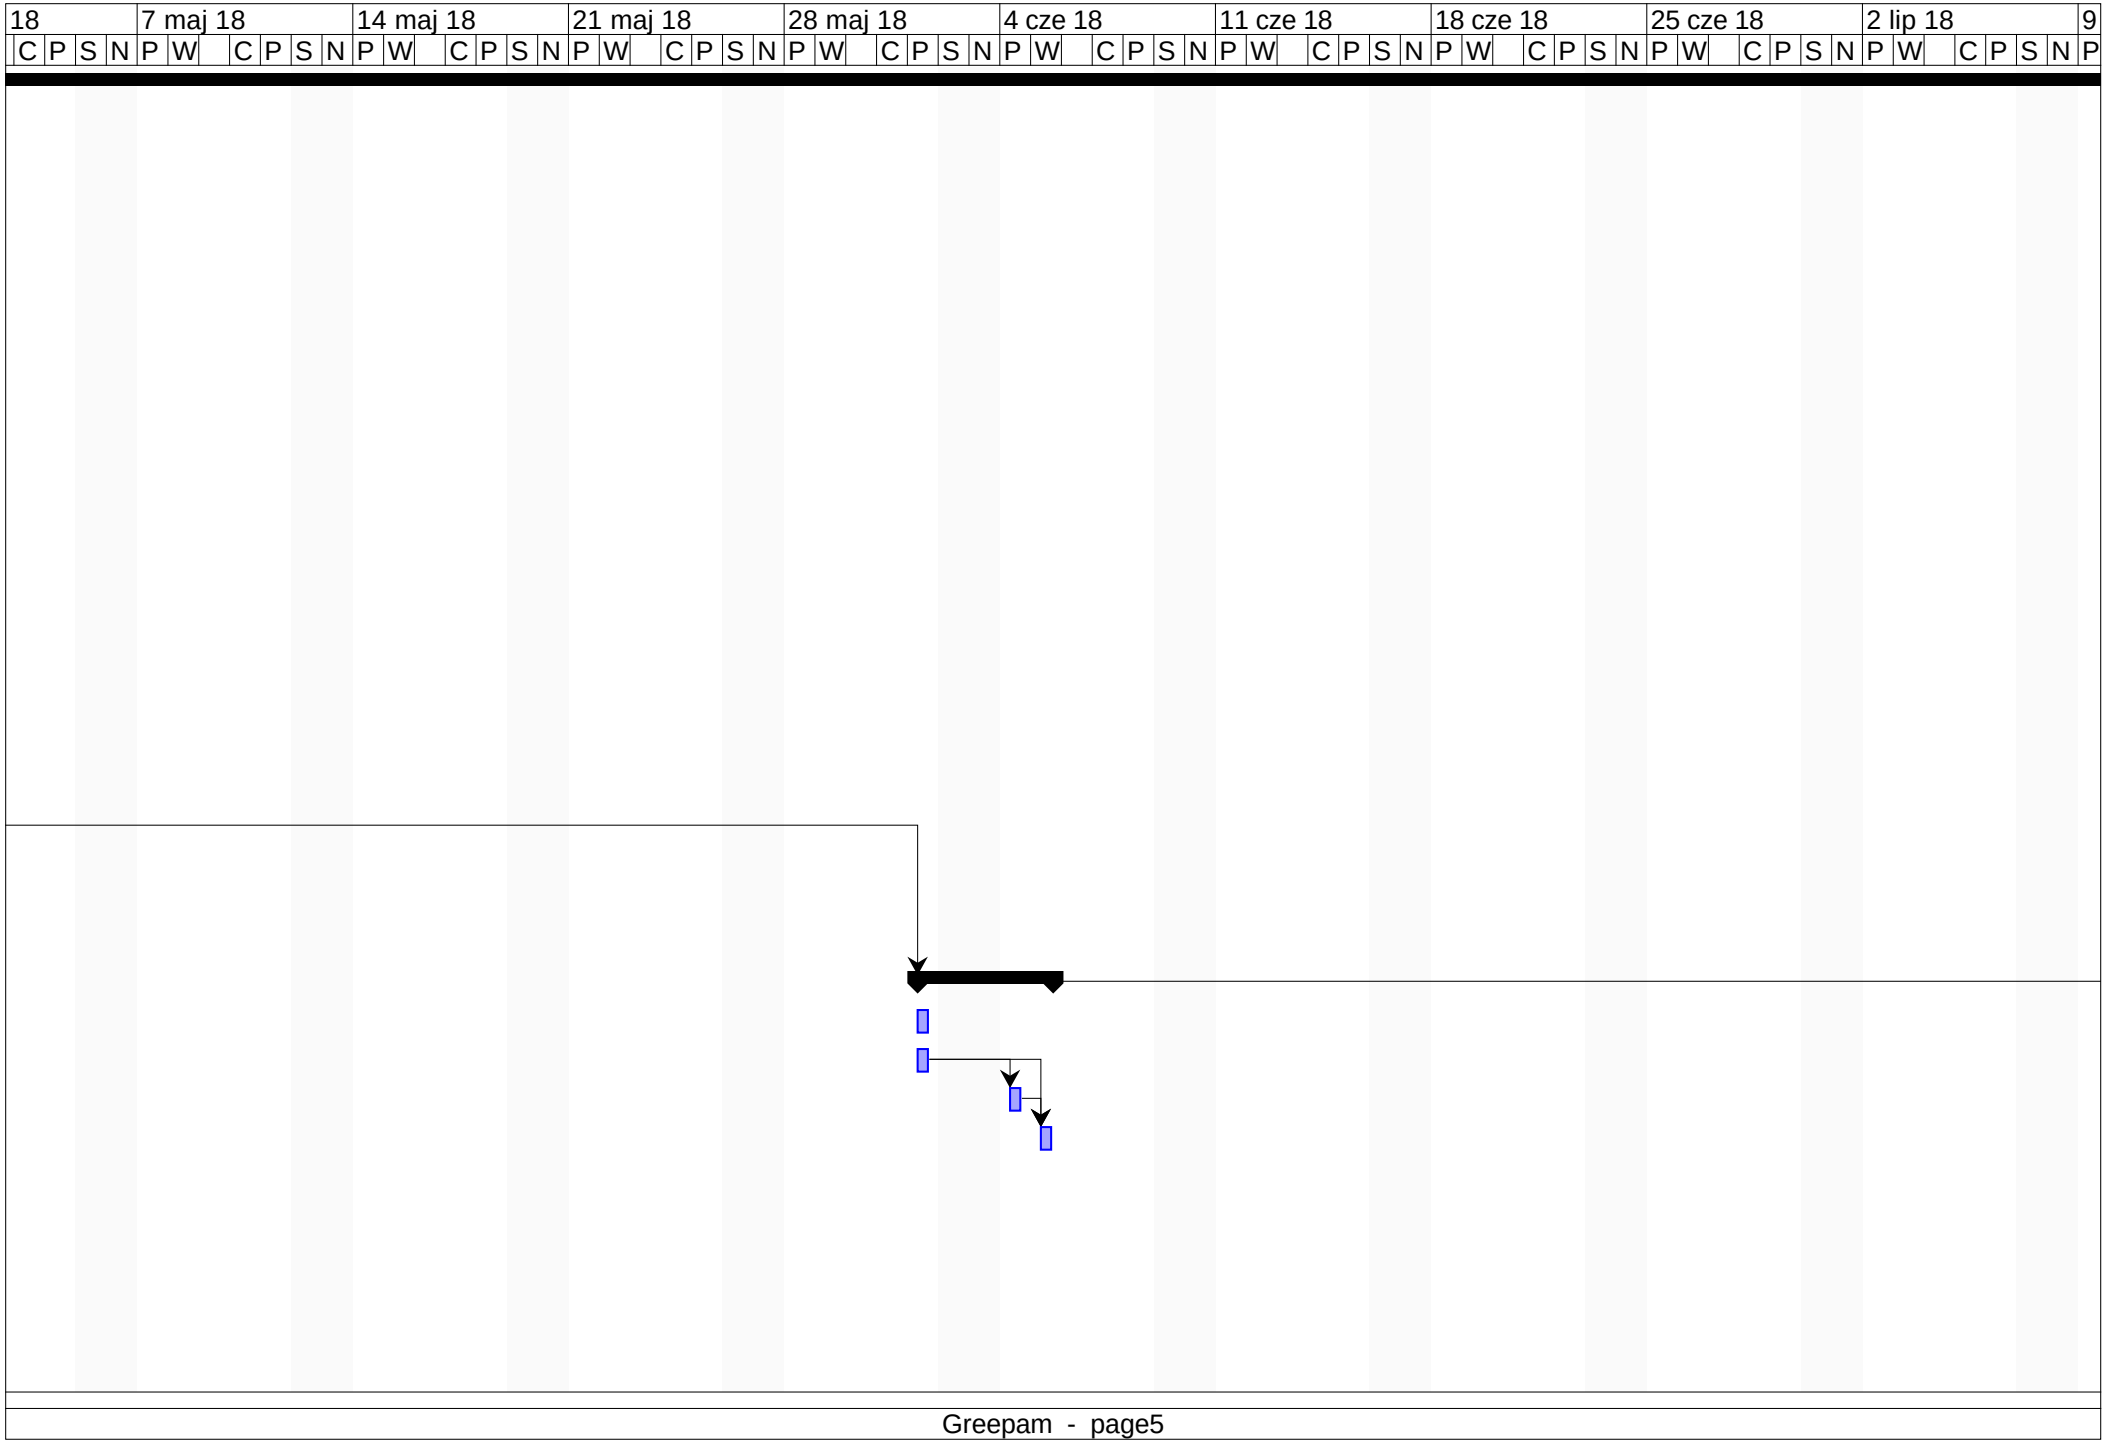
18
7 maj 18
14 maj 18
21 maj 18
28 maj 18
4 cze 18
11 cze 18
18 cze 18
25 cze 18
2 lip 18
9
C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P

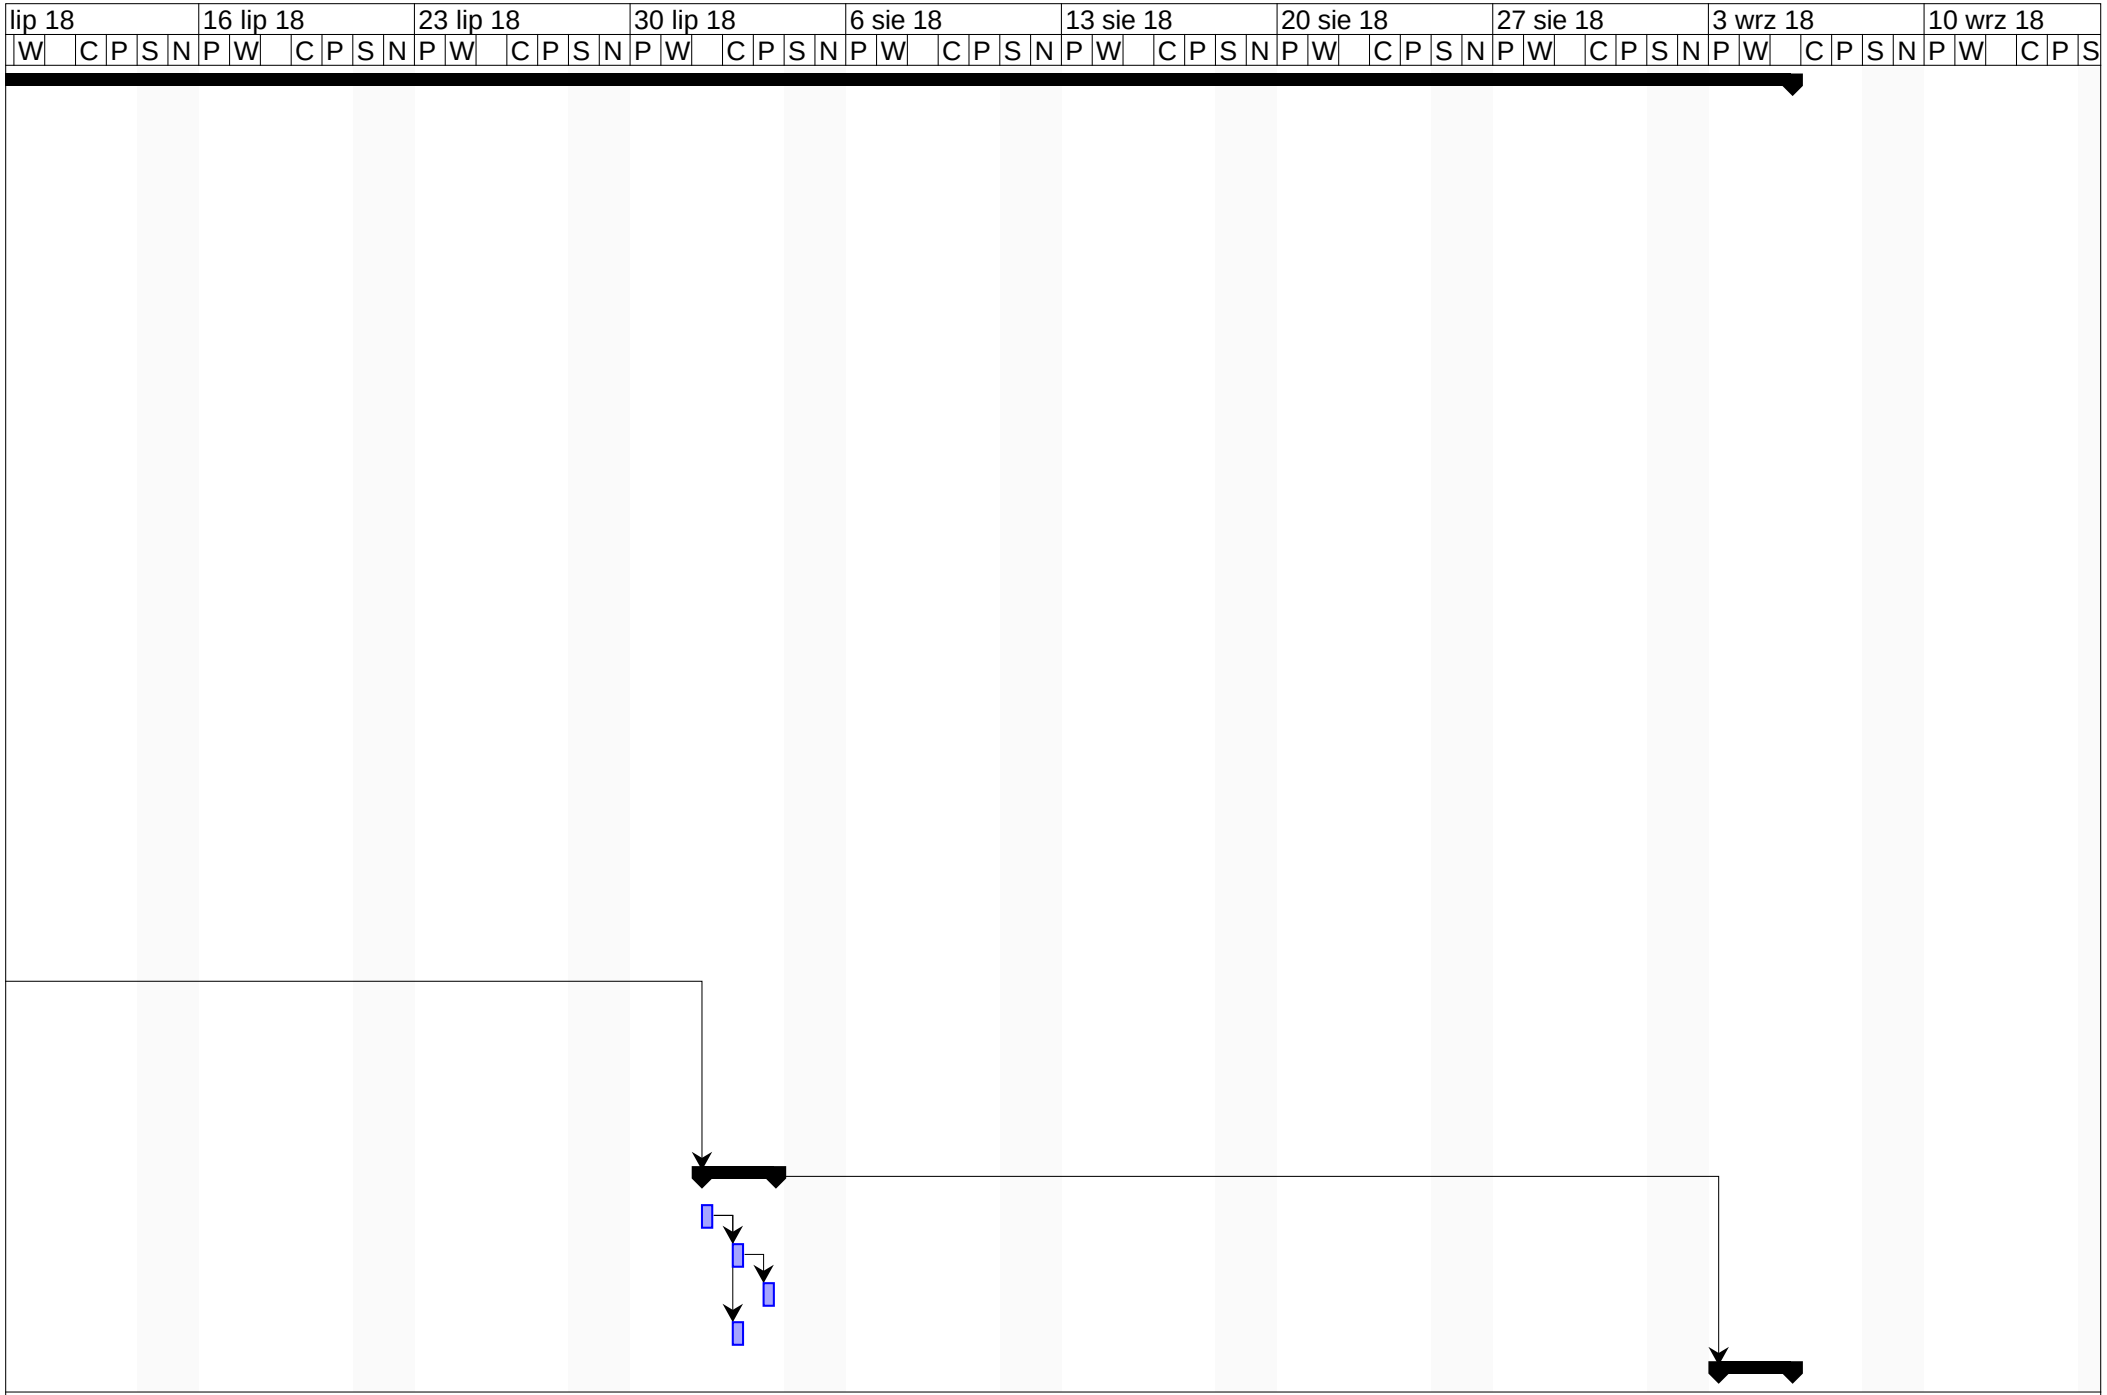
lip 18
16 lip 18
23 lip 18
30 lip 18
6 sie 18
13 sie 18
20 sie 18
27 sie 18
3 wrz 18
10 wrz 18
W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S N P W C P S

	17 wrz 18							24 wrz 18							1 pa 18					
N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
35		Award users	1 day?	03.09.18 08:00	03.09.18 17:00	
36		Optimize usage of parking spaces	1 day?	03.09.18 08:00	03.09.18 17:00	
37		Research employees commuting habits	1 day?	03.09.18 08:00	03.09.18 17:00	
38		Find out usage of tracking employees	1 day?	04.09.18 08:00	04.09.18 17:00	37
39		Organize employees feedback (surveys)	1 day?	03.09.18 08:00	03.09.18 17:00	
40		Present results and futher ideas to the ...	1 day?	05.09.18 08:00	05.09.18 17:00	38;39

Resource Names			23 pa 17							30 pa 17							6 lis 17							13 lis 17							20 lis 17							27 lis 17							4 gru 17							11 gru 17						
	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N

| | 18 gru 17 | | | | | | | 25 gru 17 | | | | | | | 1 sty 18 | | | | | | | 8 sty 18 | | | | | | | 15 sty 18 | | | | | | | 22 sty 18 | | | | | | | 29 sty 18 | | | | | | | 5 lut 18 | | | | | | | 12 lut 18 | | | | | | | 19 lut 18 | | | | | |
|---|---|---

| | 26 lut 18 | | | | | | | 5 mar 18 | | | | | | | 12 mar 18 | | | | | | | 19 mar 18 | | | | | | | 26 mar 18 | | | | | | | 2 kwi 18 | | | | | | | 9 kwi 18 | | | | | | | 16 kwi 18 | | | | | | | 23 kwi 18 | | | | | | | 30 kwi | |
|---|---|---

| 18 | | | | 7 maj 18 | | | | | | | 14 maj 18 | | | | | | | 21 maj 18 | | | | | | | 28 maj 18 | | | | | | | 4 cze 18 | | | | | | | 11 cze 18 | | | | | | | 18 cze 18 | | | | | | | 25 cze 18 | | | | | | | 2 lip 18 | | | | | | | 9 |
|---|---|---

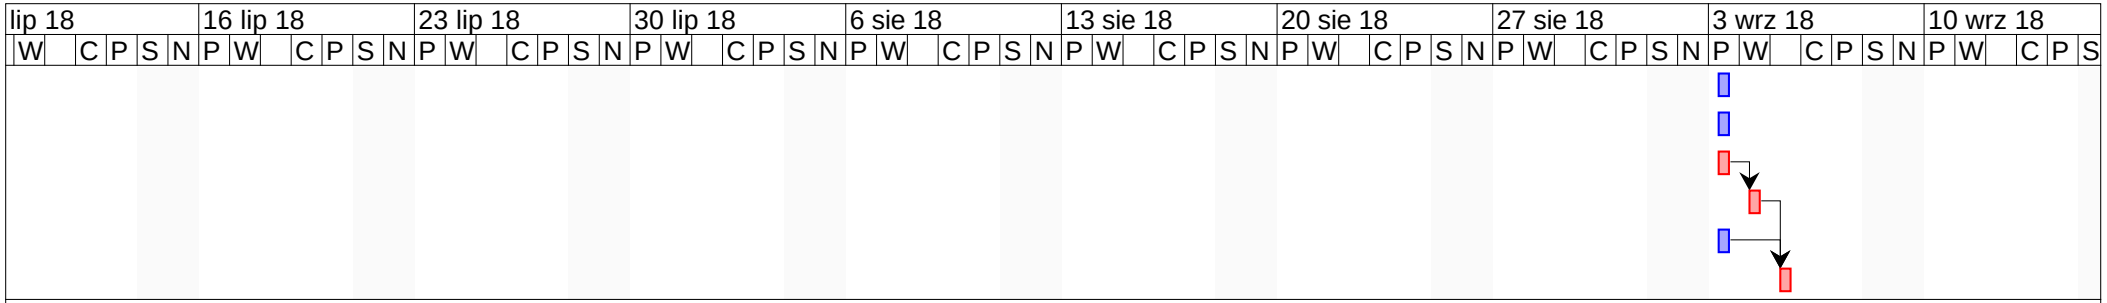
lip 18
W C P S N
16 lip 18
P W C P S N
23 lip 18
P W C P S N
30 lip 18
P W C P S N
6 sie 18
P W C P S N
13 sie 18
P W C P S N
20 sie 18
P W C P S N
27 sie 18
P W C P S N
3 wrz 18
P W C P S N
10 wrz 18
P W C P S

	17 wrz 18							24 wrz 18							1 pa 18					
N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	S	N	P	W		C	P	
